Projekt		Aktiviteter
Tidplan Kinda Kommun REV008		
Utfärdad	Reviderad	Ansvarig
2026-01-13	2026-06-23	Carl Alexandersson (UE)
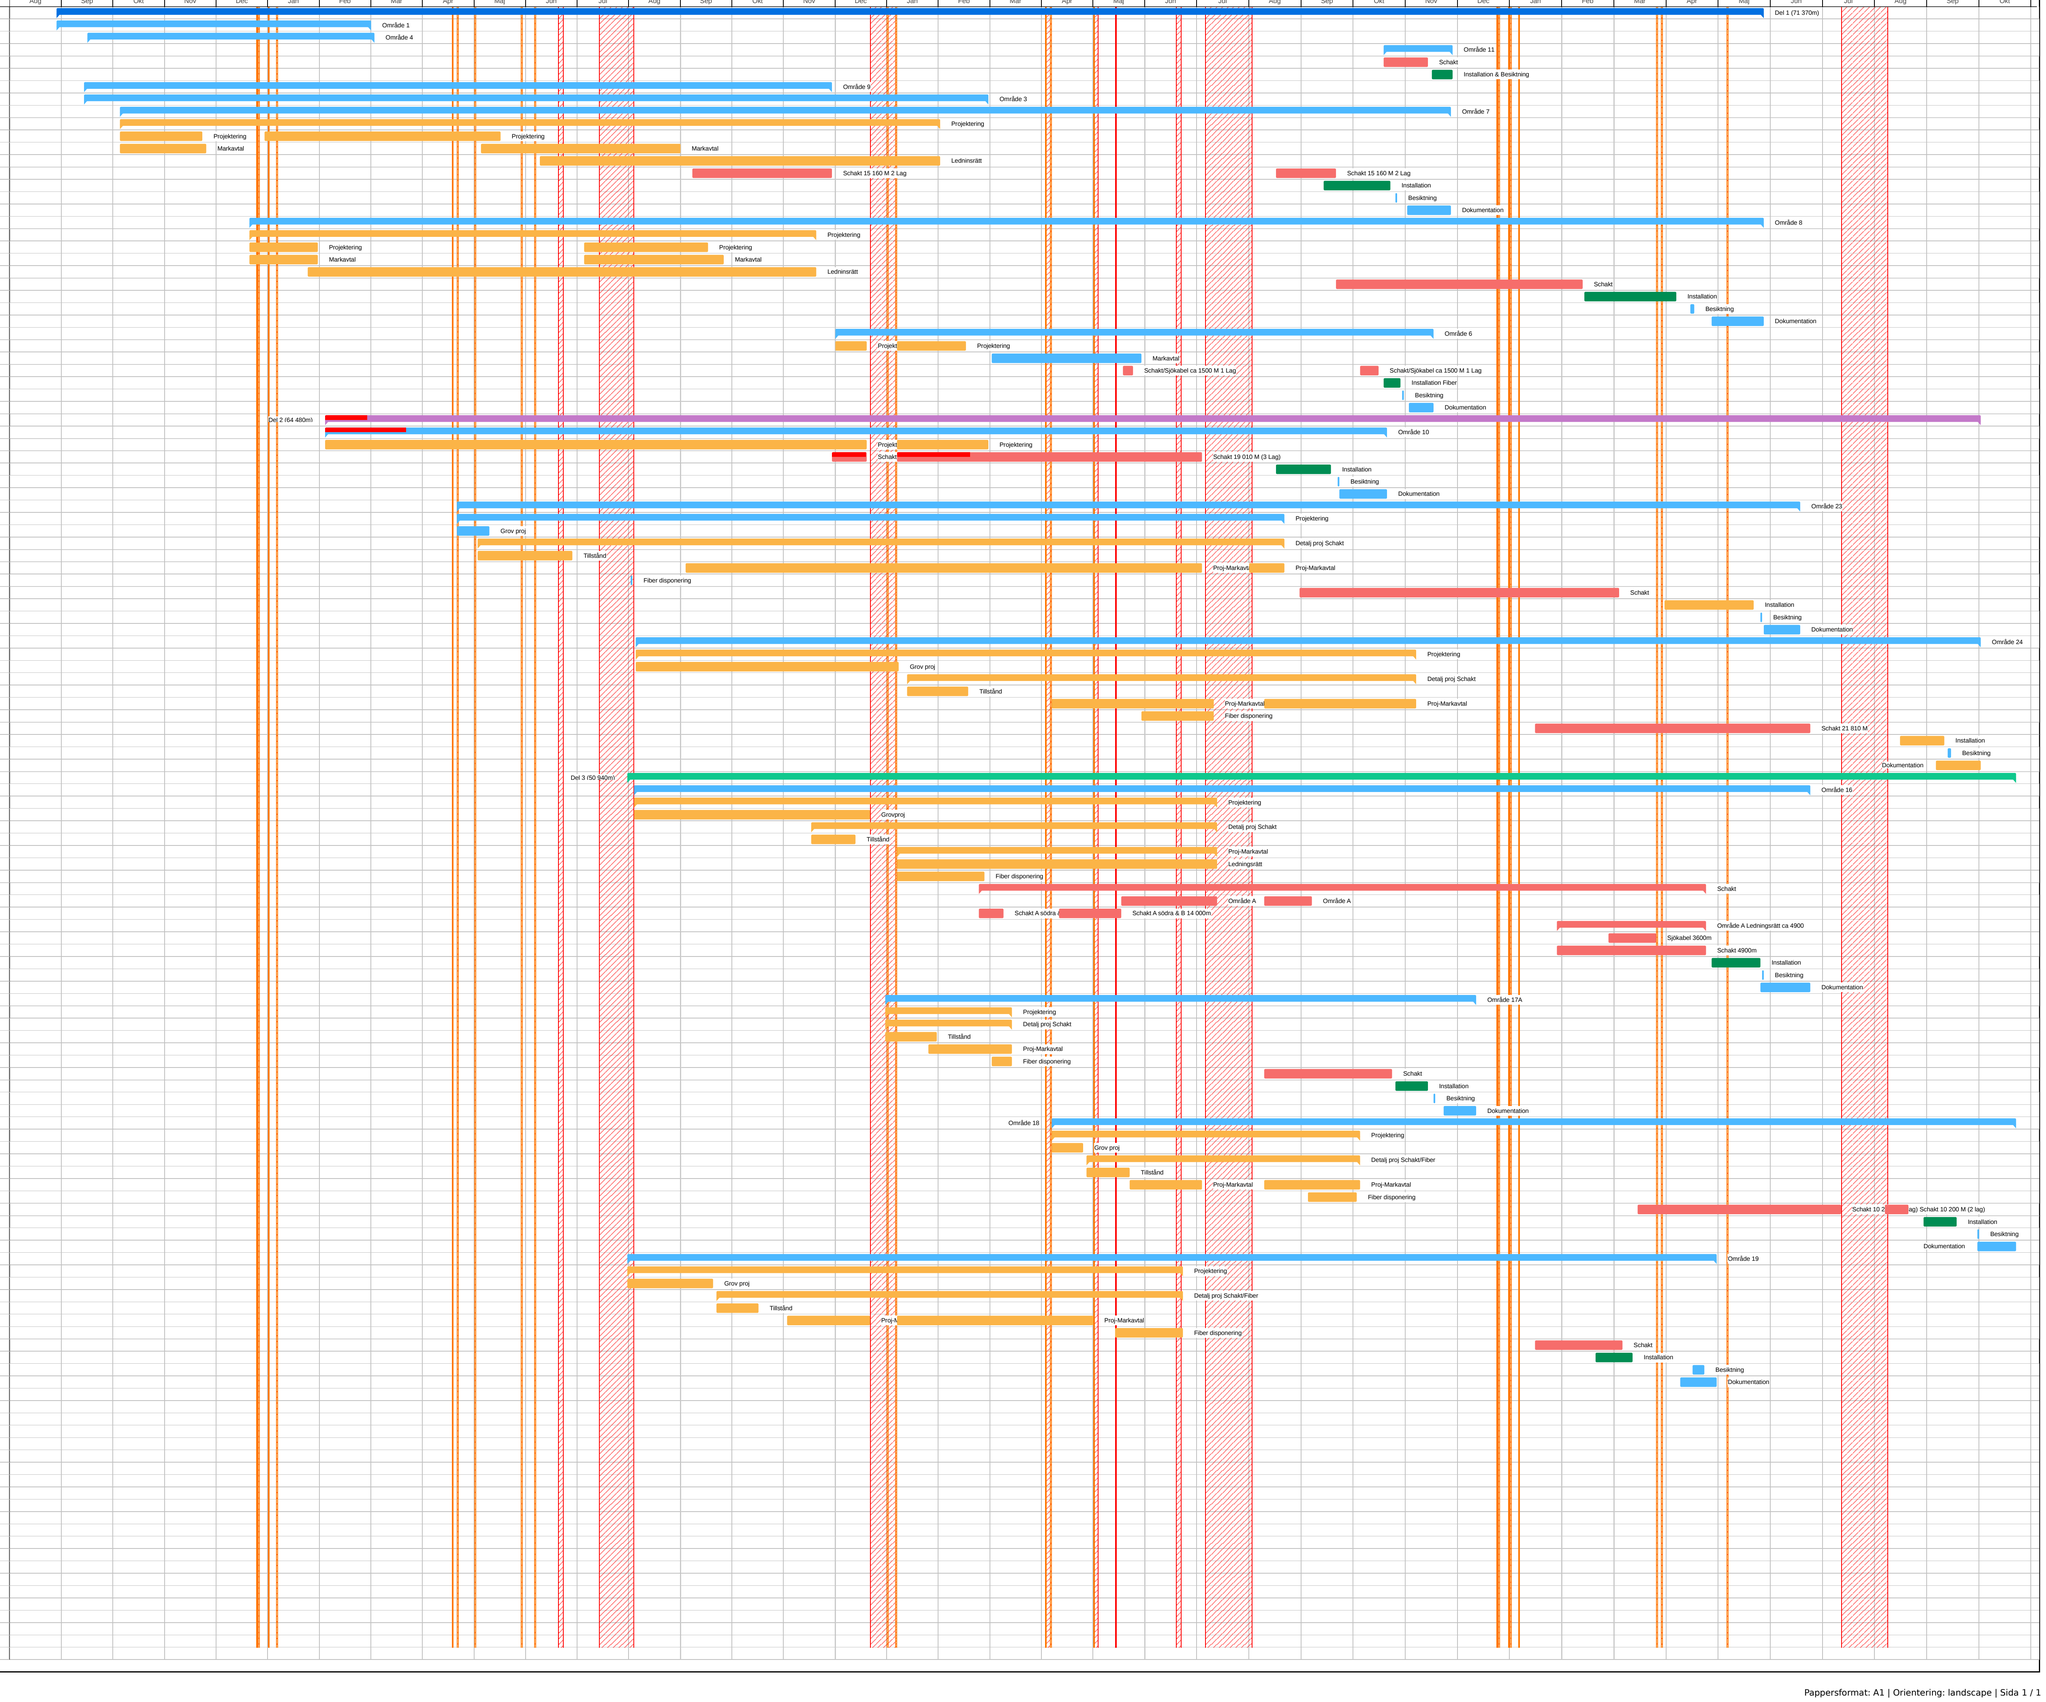
Aktivitet	Start	Slut	Bd	%
Del 1 (71 370m)	**2024-08-29**	**2027-05-27**	**646**	**0**
Område 1	**2024-08-29**	**2025-02-28**	**128**	**0**
Område 4	**2024-09-16**	**2025-03-02**	**116**	**0**
Område 11	**2026-10-19**	**2026-11-27**	**30**	**0**
Schakt	2026-10-19	2026-11-13	20	0
Installation & Besiktning	2026-11-16	2026-11-27	10	0
Område 9	**2024-09-14**	**2025-11-28**	**290**	**0**
Område 3	**2024-09-14**	**2026-02-27**	**343**	**0**
Område 7	**2024-10-05**	**2026-11-26**	**497**	**0**
Projektering	**2024-10-05**	**2026-02-01**	**308**	**0**
Projektering	2024-10-05	2025-05-16	130	0
Markavtal	2024-10-05	2025-08-31	102	0
Ledninsrätt	2025-06-09	2026-02-01	142	0
Schakt	2025-09-08	2026-09-20	85	0
Installation	2026-10-22	2026-10-22	29	0
Besiktning	2026-10-26	2026-10-26	1	0
Dokumentation	2026-11-02	2026-11-26	19	0
Område 8	**2024-12-21**	**2027-05-27**	**564**	**0**
Projektering	**2024-12-21**	**2025-11-19**	**212**	**0**
Projektering	2024-12-21	2025-09-16	62	0
Markavtal	2024-12-21	2025-09-25	69	0
Ledninsrätt	2025-01-25	2025-11-19	191	0
Schakt	2026-09-21	2027-02-11	99	0
Installation	2027-02-13	2027-04-06	34	0
Besiktning	2027-04-15	2027-04-16	2	0
Dokumentation	2027-04-27	2027-05-27	22	0
Område 6	**2025-12-01**	**2026-11-16**	**214**	**0**
Projektering	2025-12-01	2026-02-15	43	0
Markavtal	2026-03-02	2026-05-29	61	0
Schakt/Sjökabel ca 1500 M 1 Lag	2026-05-19	2026-10-15	13	0
Installation Fiber	2026-10-19	2026-10-28	8	0
Besiktning	2026-10-30	2026-10-30	1	0
Dokumentation	2026-11-03	2026-11-16	10	0
Del 2 (64 480m)	**2025-02-04**	**2027-10-01**	**608**	**3**
Område 10	**2025-02-04**	**2026-10-20**	**388**	**10**
Projektering	2025-02-04	2026-02-27	246	0
Schakt	2025-11-29	2026-07-03	138	32
Installation	2026-08-17	2026-09-17	24	0
Besiktning	2026-09-22	2026-09-22	1	0
Dokumentation	2026-09-23	2026-10-20	20	0
Område 23	**2025-04-21**	**2027-06-17**	**499**	**0**
Projektering	**2025-04-21**	**2026-08-21**	**293**	**0**
Grov proj	2025-04-21	2025-05-09	13	0
Detalj proj Schakt	**2025-05-03**	**2026-08-21**	**285**	**0**
Tillstånd	2025-05-03	2025-06-27	37	0
Proj-Markavtal	2025-09-04	2026-08-21	215	0
Fiber disponering	2025-08-02	2025-08-02	0	0
Schakt	2026-08-31	2027-03-03	128	0
Installation	2027-03-31	2027-05-21	37	0
Besiktning	2027-05-26	2027-05-26	1	0
Dokumentation	2027-05-28	2027-06-17	15	0
Område 24	**2025-08-05**	**2027-10-01**	**499**	**0**
Projektering	**2025-08-05**	**2026-11-06**	**292**	**0**
Grov proj	2025-08-05	2026-01-07	100	0
Detalj proj Schakt	**2026-01-13**	**2026-11-06**	**189**	**0**
Tillstånd	2026-01-13	2026-02-16	25	0
Proj-Markavtal	2026-04-07	2026-11-06	126	0
Fiber disponering	2026-05-30	2026-07-10	24	0
Schakt 21 810 M	2027-01-16	2027-06-23	109	0
Installation	2027-08-16	2027-09-10	20	0
Besiktning	2027-09-13	2027-09-14	2	0
Dokumentation	2027-09-06	2027-10-01	20	0
Del 3 (50 940m)	**2025-07-31**	**2027-10-22**	**515**	**0**
Område 16	**2025-08-04**	**2026-06-23**	**448**	**0**
Projektering	**2025-08-04**	**2026-07-12**	**223**	**0**
Grovproj	2025-08-04	2025-12-21	100	0
Detalj proj Schakt	**2025-11-17**	**2026-07-12**	**148**	**0**
Tillstånd	2025-11-17	2025-12-12	20	0
Proj-Markavtal	**2026-01-07**	**2026-07-12**	**123**	**0**
Ledningsrätt	2026-01-07	2026-07-12	123	0
Fiber disponering	2026-01-07	2026-02-25	36	0
Schakt	**2026-02-23**	**2027-04-23**	**272**	**0**
Område A ca 7000m	2026-05-18	2026-09-06	54	0
Område B	2026-02-23	2026-05-17	33	0
Område A Ledningsrätt ca 4900	**2027-01-29**	**2027-04-23**	**58**	**0**
Sjökabel 3600m	2027-02-26	2027-03-25	20	0
Schakt 4900m	2027-01-29	2027-04-23	58	0
Installation	2027-04-27	2027-05-25	20	0
Besiktning	2027-05-27	2027-05-27	1	0
Dokumentation	2027-05-26	2027-06-23	21	0
Område 17A	**2025-12-31**	**2026-12-11**	**218**	**0**
Projektering	**2025-12-31**	**2026-03-13**	**48**	**0**
Detalj proj Schakt	**2025-12-31**	**2026-03-13**	**48**	**0**
Tillstånd	2025-12-31	2026-01-30	18	0
Proj-Markavtal	2026-01-26	2026-03-13	35	0
Fiber disponering	2026-03-02	2026-03-13	10	0
Schakt	2026-08-10	2026-10-23	55	0
Installation	2026-10-26	2026-11-13	15	0
Besiktning	2026-11-17	2026-11-17	1	0
Dokumentation	2026-11-23	2026-12-11	15	0
Område 18	**2026-04-07**	**2027-10-22**	**353**	**0**
Projektering	**2026-04-07**	**2026-10-04**	**106**	**0**
Grov proj	2026-04-07	2026-04-24	14	0
Detalj proj Schakt/Fiber	**2026-04-27**	**2026-10-04**	**92**	**0**
Tillstånd	2026-04-27	2026-05-22	18	0
Proj-Markavtal	2026-05-23	2026-10-04	69	0
Fiber disponering	2026-09-05	2026-10-02	20	0
Schakt	2027-03-15	2027-08-20	92	0
Installation	2027-08-30	2027-09-17	15	0
Besiktning	2027-09-30	2027-09-30	1	0
Dokumentation	2027-09-30	2027-10-22	17	0
Område 19	**2025-07-31**	**2027-04-29**	**410**	**0**
Projektering	**2025-07-31**	**2026-06-22**	**214**	**0**
Grov proj	2025-07-31	2025-09-19	35	0
Detalj proj Schakt/Fiber	**2025-09-22**	**2026-06-22**	**179**	**0**
Tillstånd	2025-09-22	2025-10-16	19	0
Proj-Markavtal	2025-11-03	2026-04-30	115	0
Fiber disponering	2026-05-14	2026-06-22	26	0
Schakt	2027-01-16	2027-03-05	35	0
Installation	2027-02-19	2027-03-11	15	0
Besiktning	2027-04-16	2027-04-22	5	0
Dokumentation	2027-04-09	2027-04-29	15	0
